Vodohospodářské investice Úvaly
ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
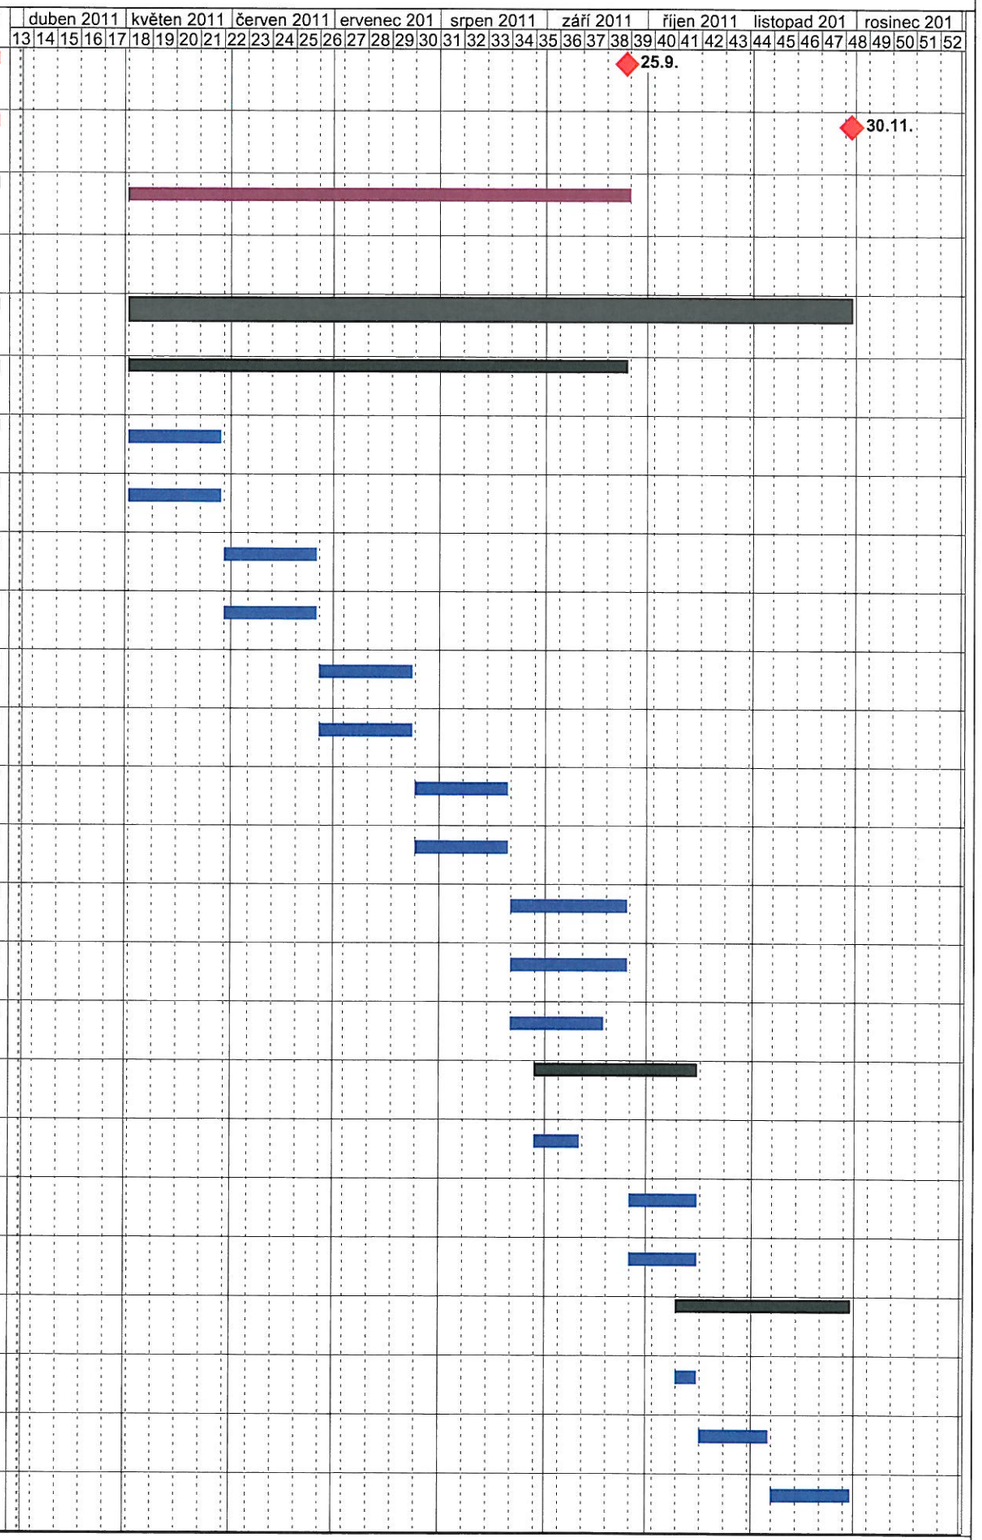
Název úkolu	Ulice	Staničení	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
Uzlový bod č. 1 - zprovoznění ulice Pražské			1 den	25.9. 11	25.9. 11
Uzlový bod č. 2 - dokončení lokality Pražská, Švermova, ...			1 den	30.11. 11	30.11. 11
Uzavírka ulice Pražské po úsecích			147 dny	2.5. 11	25.9. 11
Lokalita Pražská, Švermova, Šafaříkova			**212 dny**	**2.5. 11**	**29.11. 11**
ulice Pražská			**146 dny**	**2.5. 11**	**24.9. 11**
kanalizace úsek od Š 146 do Š 701 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,000 - 0,100	27 dny	2.5. 11	28.5. 11
vodovod 1. úsek od V1 do úrovně čp. 1231 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,000 - 0,075	27 dny	2.5. 11	28.5. 11
kanalizace úsek od Š 701 do Š 704 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,100 - 0,200	27 dny	30.5. 11	25.6. 11
vodovod 2. úsek od čp. 1231 do úrovně čp. 468 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,075 -0,175	27 dny	30.5. 11	25.6. 11
kanalizace úsek od Š 704 do Š 707 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,200 - 0,300	27 dny	27.6. 11	23.7. 11
vodovod 3. úsek od čp. 468 do úrovně čp. 1023 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,175 - 0,275	27 dny	27.6. 11	23.7. 11
kanalizace úsek od Š 707 do Š 709 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,300 - 0,400	27 dny	25.7. 11	20.8. 11
vodovod 3. úsek od čp. 1023 do úrovně čp. 456 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,275 - 0,375	27 dny	25.7. 11	20.8. 11
kanalizace úsek od Š 709 do Š 711	PRAŽSKÁ	0,400 - 0,492	34 dny	22.8. 11	24.9. 11
vodovod 4. úsek od čp. 456 přes V3 do V5	PRAŽSKÁ	0,375 - 0,459	34 dny	22.8. 11	24.9. 11
příčný práh Pražská	PRAŽSKÁ		27 dny	22.8. 11	17.9. 11
ukice Švermova			**48 dny**	**29.8. 11**	**15.10. 11**
vodovod z V3 z ulice Pražská 1. úsek po čp.01	ŠVERMOVA	0,000 - 0,058	13 dny	29.8. 11	10.9. 11
kanalizace od stáv. šachta AE 4-4-1 do Š 712	ŠVERMOVA	0,000 - 0,050	20 dny	26.9. 11	15.10. 11
vodovod z V7 z ulice Šafaříkova k čp. 01 vč. propojení	ŠVERMOVA	0,058 - 0,106	20 dny	26.9. 11	15.10. 11
ulice Šafaříkova			**51 dny**	**10.10. 11**	**29.11. 11**
přípravné práce	ŠAFAŘÍKOVA		6 dny	10.10. 11	15.10. 11
kanalizace úsek od Š 112 do Š 114 vč. přípojek	ŠAFAŘÍKOVA	0,000 - 0,067	20 dny	17.10. 11	5.11. 11
kanalizace úsek od Š 114 do Š 116 vč. přípojek	ŠAFAŘÍKOVA	0,067 - 0,145	23 dny	7.11. 11	29.11. 11
